



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

• معرفی پروژه

۲.....	مقدمه
۲.....	اهداف پروژه
۳.....	خلاصه مشخصات پروژه
۳.....	مشخصات فنی پروژه
۴.....	مشخصات کلی پروژه
۵.....	پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه
۶.....	وضعیت پروژه
۶.....	مشکلات پروژه

• گزارش فعالیت های اجرایی

۷.....	گزارش تصویری پیشرفت پروژه
--------	---------------------------



صفحه:

شماره گزارش:

تاریخ گزارش:

۱ از ۴۴

۱

۱۳۹۴/۶/۲۱

 وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (تخصصی)	پروژه های محرم تا محرم	عنوان پروژه: مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین
معاونت فنی و نظارت اداره کل نظارت بر امور اجرایی	گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین	کنترل پروژه

مقدمه:

طبق سیاست های شرکت مادر تخصصی مقرر شد دو مرکز محله و محله های منتهی به آن بوسیله شرکت مادر و دو محله نیز توسط شهرداری نائین ساماندهی و بهسازی شود. بهمین منظور محور کلوان و محور تکیه چهل دختران مقرر شد توسط شرکت مادر اجرا شود که در مورخه ۹۳/۱۱/۷ قراردادی جهت شروع عملیات اجرایی با شرکت عمران و ساماندهی بافت نائین منعقد گردید. فاز یک این پروژه خاتمه و قرارداد دوم جهت تکمیل پروژه فوق در دست پیگیری می باشد. شایان ذکر است که این پروژه در قالب طرح محرم تا محرم قرار دارد و محور و تکیه آن تا محرم سال جاری ۱۳۹۴/۷/۲۳ باید آماده افتتاح باشد.

اهداف پروژه:

احیا این محور به منظور بازسازی و جلوگیری از خطرات ناشی از فرسودگی و مرمت و احیا و باز زنده سازی بافت و حفظ الگوی شبکه معابر تا جای ممکن و ایجاد مراکز فرهنگی با مکایسم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با این تفکر جهت شروع کار فرهنگی مقرر شد با قرارگیری تکیه کلوان مسیر محور محوطه تکیه بازسازی و مرمت شود که در الگوی محرم تا محرم سال جاری پروژه افتتاح شود.

اهداف اصلی ارتقا کیفیت تمامی شئون زندگی مردم می باشد.

صفحه:	شماره گزارش:	تاریخ گزارش:
۴۴ از ۲	۱	۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

مشخصات کلی و فنی پروژه:

خلاصه مشخصات کلی پروژه

عنوان پروژه:

تهیه مصالح و اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی محور کلوان نائین

محل اجرا:

محدوده تکیه کلوان و معابر منتهی به آن

منطقه: محور کلوان

شهر: نائین

استان: اصفهان

خلاصه مشخصات فنی پروژه

ردیف	عنوان	شرح
۱-	بدنه سازی محور	لایه برداری دیوار و اجرای جرز آجری و اجرای سیم گل
۲-	کف سازی	تراشیدن هر نوع آسفالت و بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان
۳-	کف سازی تکیه و رواق های موجود	تراشیدن آسفالت و اجرای کف با سنگ لاشه و سفید کردن رواق ها

صفحه:

۴۴ از ۳

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

مشخصات کلی پروژه:

مشخصات کلی پروژه

کارفرما:

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

پیمانکار:

شرکت عمران و ساماندهی بافت نائین

مشاور و مدیریت طرح:

آقای دکتر مشهدی زاده

شماره قرارداد:

۹۳/۵۱۴/۵۵۴۶

تاریخ قرارداد:

۱۳۹۳/۱۱/۰۷

مبلغ قرارداد:

۱،۱۱۰،۵۶۴،۶۴۳ ریال

جمع مبلغ پرداختی تا این تاریخ:

۹۸۵،۴۳۶،۴۳۰ ریال

مدت زمان پیمان:

۶ ماه

تاریخ شروع کار:

۹۴/۱/۳

منبع تامین مالی پروژه:

ردیف اعتباری ۴۶

تاریخ پایان اجرا بر اساس برنامه زمانبندی:

۹۴/۷/۳۰

صفحه:

۴ از ۴۴

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم


عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه:

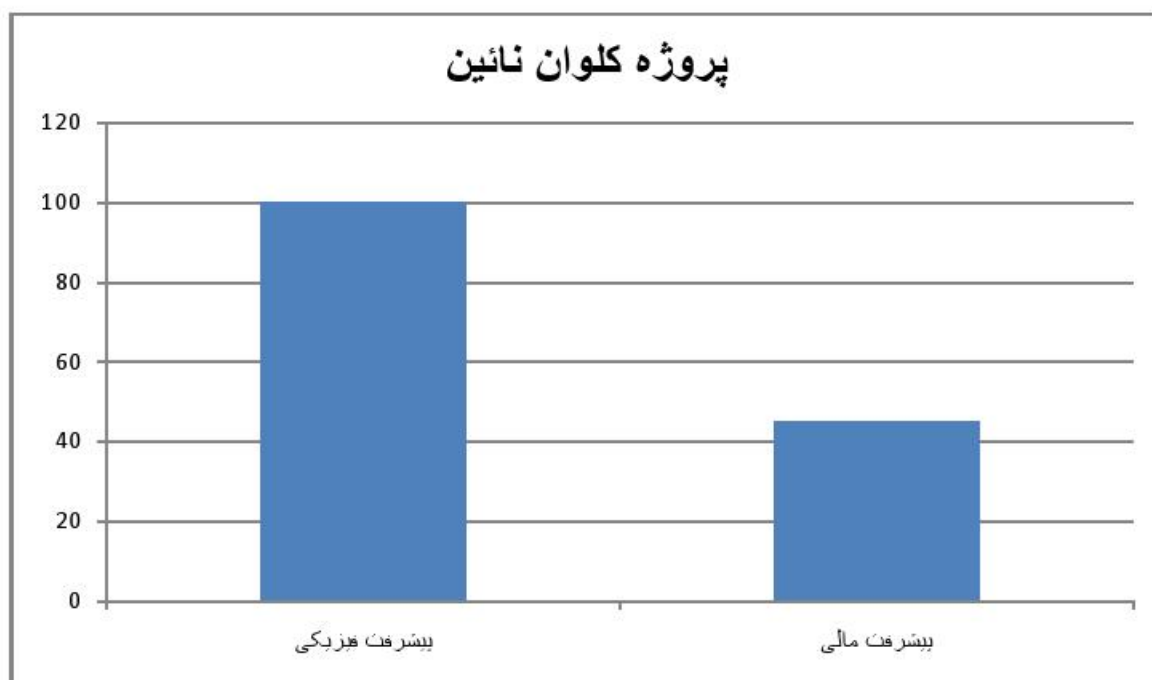

درصد پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰ درصد

درصد پیشرفت مالی: ۴۵ درصد



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

گزارش تصویری پیشرفت پروژه:

آب انبار تکیه کلوان

عملیات اجرای مرمت :



صفحه:

۴۴ از ۴۴

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۷۴

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۸

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

مرمت کف محور تاریخی محله کلوان نائین

تراز نمودن کف و اجرای حاشیه کف با آجر ۱۰×۲۰×۲۰:



صفحه:

۴۴ از ۹۴

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



جمع آوری نخاله های حاصله از تخریب کف قدیمی محور محله :

صفحه:	شماره گزارش:	تاریخ گزارش:
۴۴ از ۱۰	۱	۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



اجرای کف محور محله :

صفحه:	شماره گزارش:	تاریخ گزارش:
۴۴ از ۱۱	۱	۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



بندکشی کف:

صفحه:	شماره گزارش:	تاریخ گزارش:
۴۴ از ۱۲	۱	۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بازسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



تخریب و بازسازی محل اجرای آزارهای روی دیوار محور محله:

صفحه:	شماره گزارش:	تاریخ گزارش:
۴۴ از ۱۳	۱	۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۱۴

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۱۵

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۱۶

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۱۷

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۱۸

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۱۹

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۲۰

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بازسازی شری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



تخریب و بازسازی کف حجره های حیاط تکیه :



صفحه:

۴۴ از ۲۱

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۲۲

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

مرمت تاقهای حجره های حیاط تکیه :



صفحه:

۴۴ از ۲۳

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۲۴

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۲۵

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۲۶

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۲۷ از ۴۴

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

تخریب و خاکبرداری کف حیاط تکیه :



صفحه:

۴۴ از ۲۸

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۲۹

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۳۰

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

تخریب و خاکبرداری محورهای اطراف تکیه :



صفحه:

۴۴ از ۳۱

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



خاکریزی و رگلاژ نمودن کف حیاط تکیه :

صفحه:	شماره گزارش:	تاریخ گزارش:
۴۴ از ۳۲	۱	۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۳۳

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۳۴

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

نوله گذاری کف حیاط جهت عبور آب سطحی :



صفحه:

۴۴ از ۳۵

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

شیب بندی سطح حیاط تکیه جهت سنگ کف :



صفحه:

۴۴ از ۳۶

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۳۷

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

اجرای سنگ کف حیاط تکیه :



صفحه:

۴۴ از ۳۸

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۳۹

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۰ از ۴۴

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۴۱

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه

اتمام عملیات اجرایی پروژه :



صفحه:

۴۴ از ۴۲

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۴۳

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱



وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
(تخصصی)

پروژه های محرم تا محرم

عنوان پروژه:
مرمت تکیه و محور تاریخی کلوان نائین

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت بر امور اجرایی

گزارش مرمت تکیه و محور کلوان نائین

کنترل پروژه



صفحه:

۴۴ از ۴۴

شماره گزارش:

۱

تاریخ گزارش:

۱۳۹۴/۶/۲۱
